23078 AB Tove - Estimeret bygherre tidsplan

Udskrevet den 24. januar 2024 15:08

POWERED BY LETSBUILD

Navn

- Altanprojekt
  22-04-2024 - 18-09-2024 (149 days)
- Team 6
  22-04-2024 - 11-09-2024 (142 days)
  - Opstart
    22. apr - 23. apr (2 days) (0%)
  - (R22 og R21) Hoffmeyersvej 4 tv og th
    24-04-2024 - 24-05-2024 (30 days)
    - Altan montage
      24. apr - 23. maj (20 days) (0%)
    - Flyt platform
      24. maj - 24. maj (1 days) (0%)
  - (R20 og R19) Hoffmeyersvej 2 tv og th
    27-05-2024 - 24-06-2024 (28 days)
    - Altan montage
      27. maj - 21. jun (20 days) (0%)
    - Flyt af platform
      24. jun - 24. jun (1 days) (0%)
  - Peter Bangs vej 93, th
    25-06-2024 - 09-07-2024 (14 days)
    - Altan montage
      25. jun - 8. jul (10 days) (0%)
    - Flyt af platform
      9. jul - 9. jul (1 days) (0%)
  - Peter Bangs Vej 95, tv
    10-07-2024 - 24-07-2024 (14 days)
    - Altan montage
      10. jul - 23. jul (10 days) (0%)
    - Flyt af platform
      24. jul - 24. jul (1 days) (0%)
  - Peter Bangs Vej 95 th
    25-07-2024 - 08-08-2024 (14 days)
    - Altan montage
      25. jul - 7. aug (10 days) (0%)
    - Flyt af platform
      8. aug - 8. aug (1 days) (0%)
  - Hoffmeyersvej 1 tv
    09-08-2024 - 26-08-2024 (17 days)
    - Altan montage
      9. aug - 23. aug (11 days) (0%)
    - Fly af platform
      26. aug - 26. aug (1 days) (0%)
  - Hoffmeyersvej 1 th
    27-08-2024 - 11-09-2024 (15 days)
    - Altan montage
      27. aug - 10. sep (11 days) (0%)
    - Flyt af platform
      11. sep - 11. sep (1 days) (0%)
- Team 5
  06-05-2024 - 13-08-2024 (99 days)
  - Opstart
    6. maj - 8. maj (3 days) (0%)
  - Bendzvej 6 tv
    10-05-2024 - 28-05-2024 (18 days)
    - Altan montage
      10. maj - 27. maj (11 days) (0%)
    - Flyt af platform
      28. maj - 28. maj (1 days) (0%)

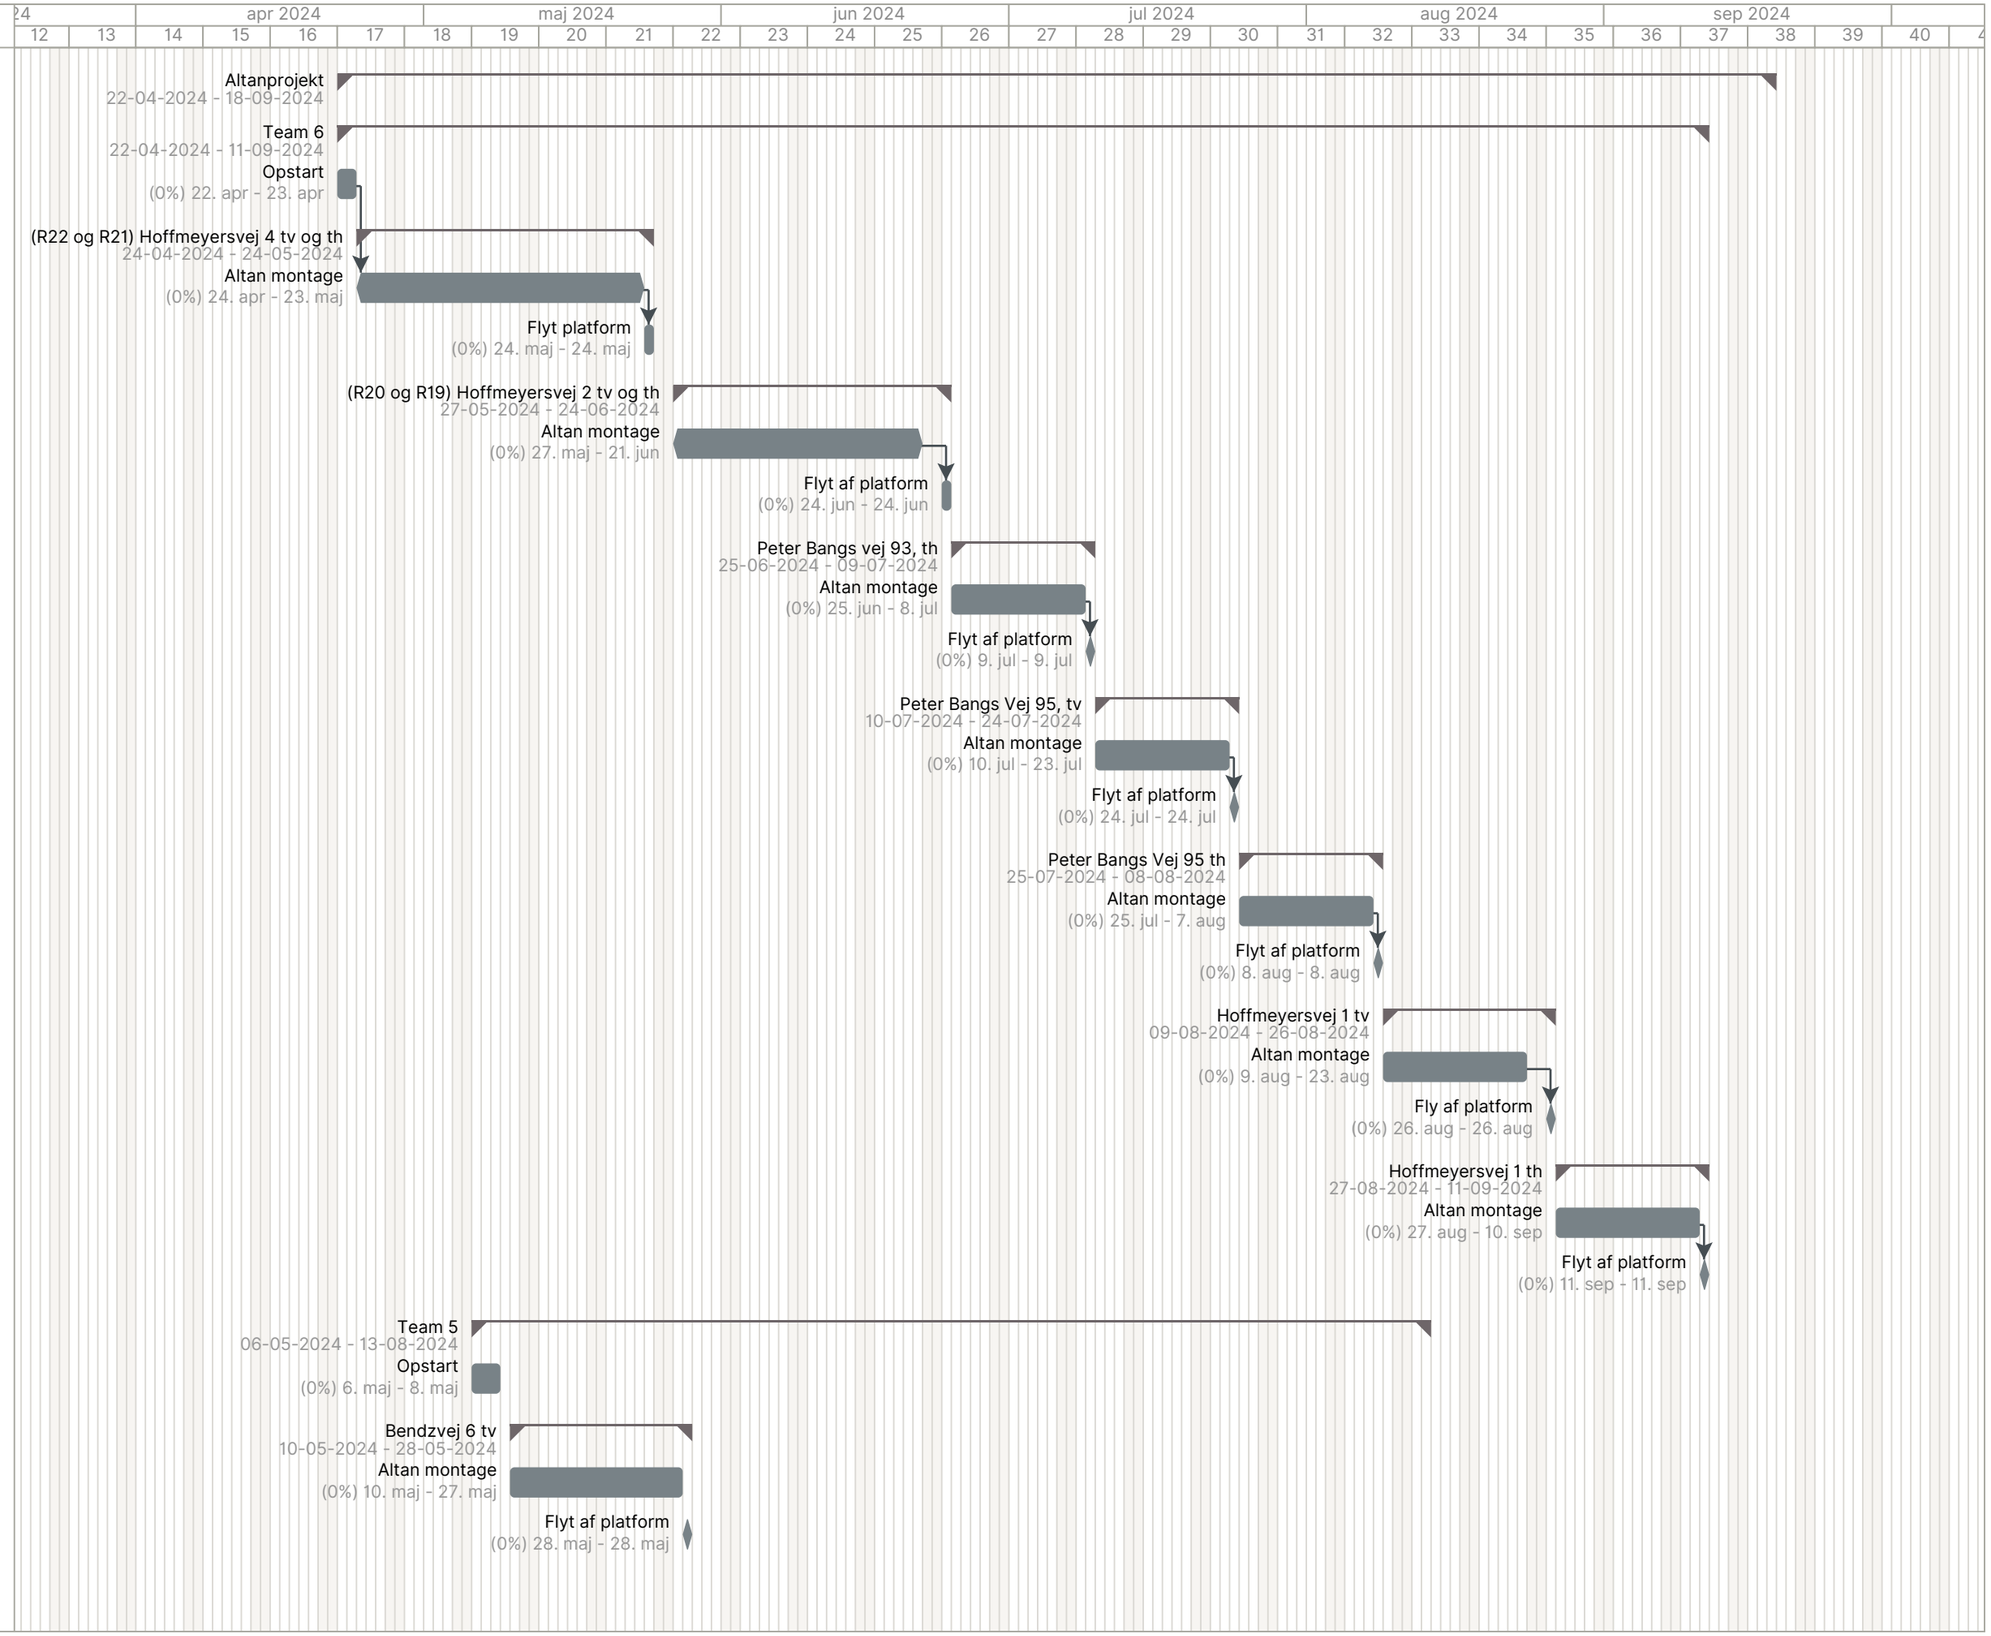

23078 AB Tove - Estimeret bygherre tidsplan

Udskrevet den 24. januar 2024 15:08

POWERED BY LETSBUILD

Navn

- Bendzvej 6 th
  29-05-2024 - 14-06-2024 (16 days)
  - Altan montage
    29. maj - 13. jun (12 days) (0%)
  - Flyt af platform
    14. jun - 14. jun (1 days) (0%)
- Bendzvej 4 tv og th
  17-06-2024 - 17-07-2024 (30 days)
  - Altan montage
    17. jun - 16. jul (22 days) (0%)
  - Flyt af platform
    17. jul - 17. jul (1 days) (0%)
- Bendzvej 2 tv
  18-07-2024 - 02-08-2024 (15 days)
  - Altan montage
    18. jul - 1. aug (11 days) (0%)
  - Flyt af platform
    2. aug - 2. aug (1 days) (0%)
- Bendzvej 2 th
  05-08-2024 - 13-08-2024 (8 days)
  - Altan montage
    5. aug - 8. aug (4 days) (0%)
  - Flyt af platform
    9. aug - 9. aug (1 days) (0%)
- Peter Bangs Vej 93 tv
  12-08-2024 - 13-08-2024 (1 days)
  - Altan montage
    12. aug - 12. aug (1 days) (0%)
  - Flyt af platform
    13. aug - 13. aug (1 days) (0%)
- Team 4
  07-05-2024 - 18-09-2024 (134 days)
  - Opstart
    7. maj - 10. maj (3 days) (0%)
- Peter Bangs Vej 91 tv
  13-05-2024 - 28-05-2024 (15 days)
  - Altan montage
    13. maj - 27. maj (10 days) (0%)
  - Flyt af platform
    28. maj - 28. maj (1 days) (0%)
- Peter Bangs Vej 91 th
  29-05-2024 - 12-06-2024 (14 days)
  - Altan montage
    29. maj - 11. jun (10 days) (0%)
  - Flyt af platform
    12. jun - 12. jun (1 days) (0%)
- Hoffmeyersvej 7 th
  13-06-2024 - 27-06-2024 (14 days)
  - Altan montage
    13. jun - 26. jun (10 days) (0%)
  - Flyt af platform
    27. jun - 27. jun (1 days) (0%)
- Hoffmeyersvej 7 tv
  28-06-2024 - 15-07-2024 (17 days)
  - Altan montage
    28. jun - 12. jul (11 days) (0%)
  - Flyt af platform
    15. jul - 15. jul (1 days) (0%)

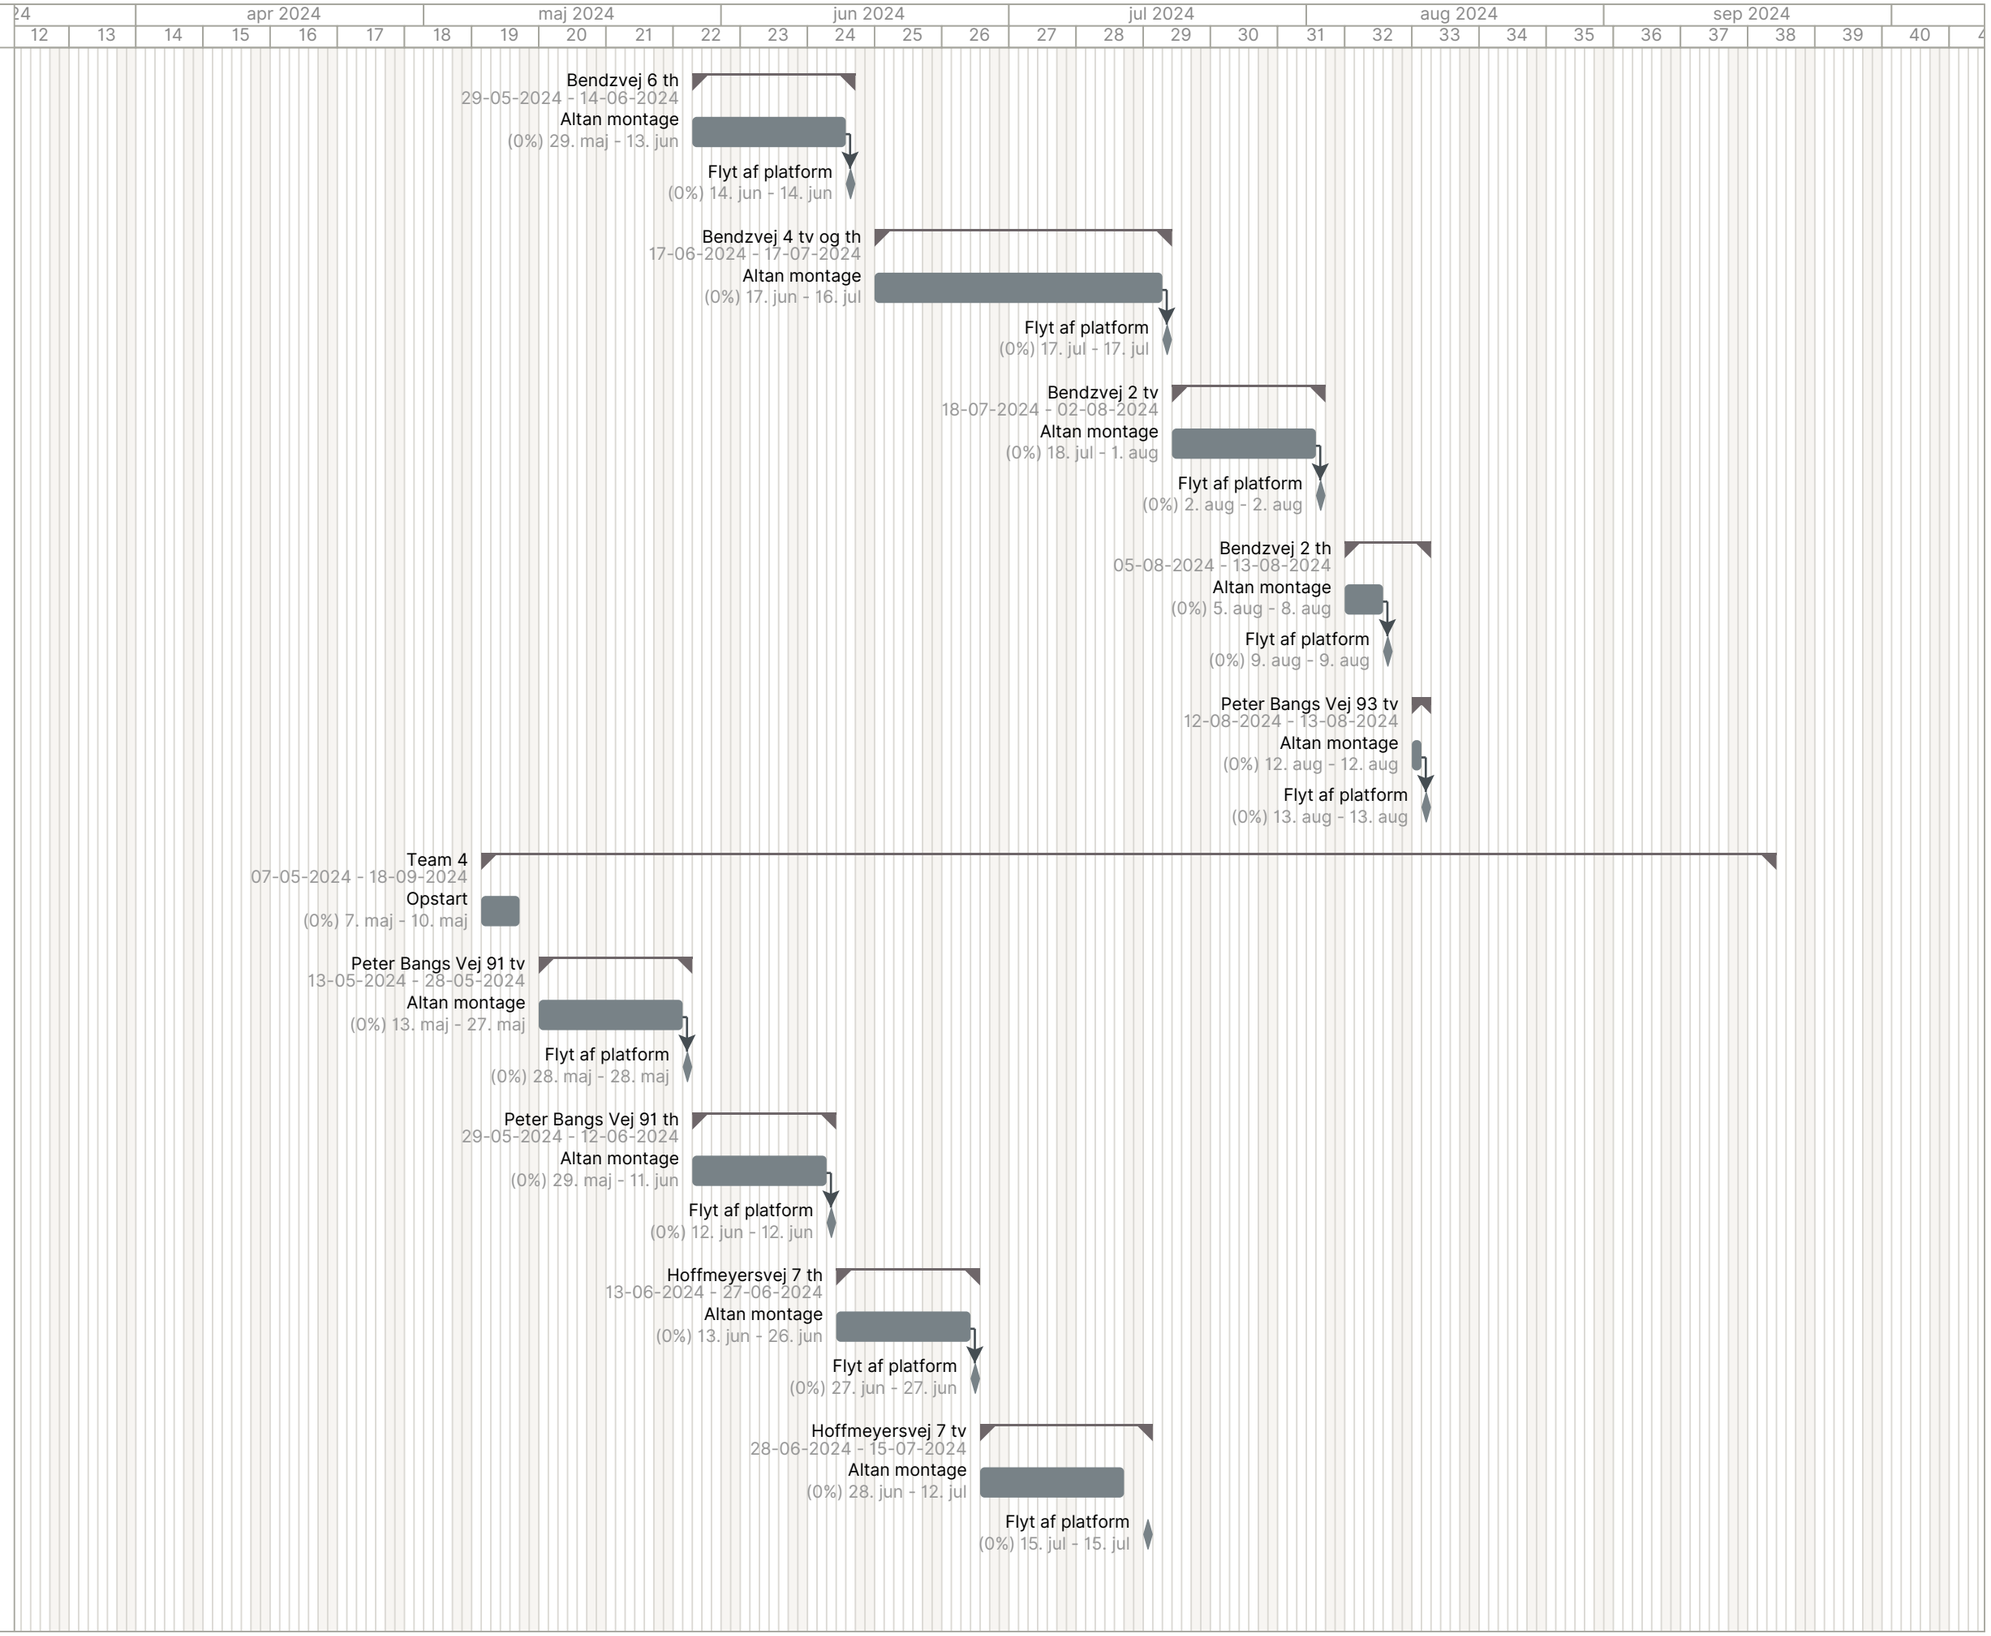

23078 AB Tove - Estimeret bygherre tidsplan

Udskrevet den 24. januar 2024 15:08

POWERED BY LETSBUILD
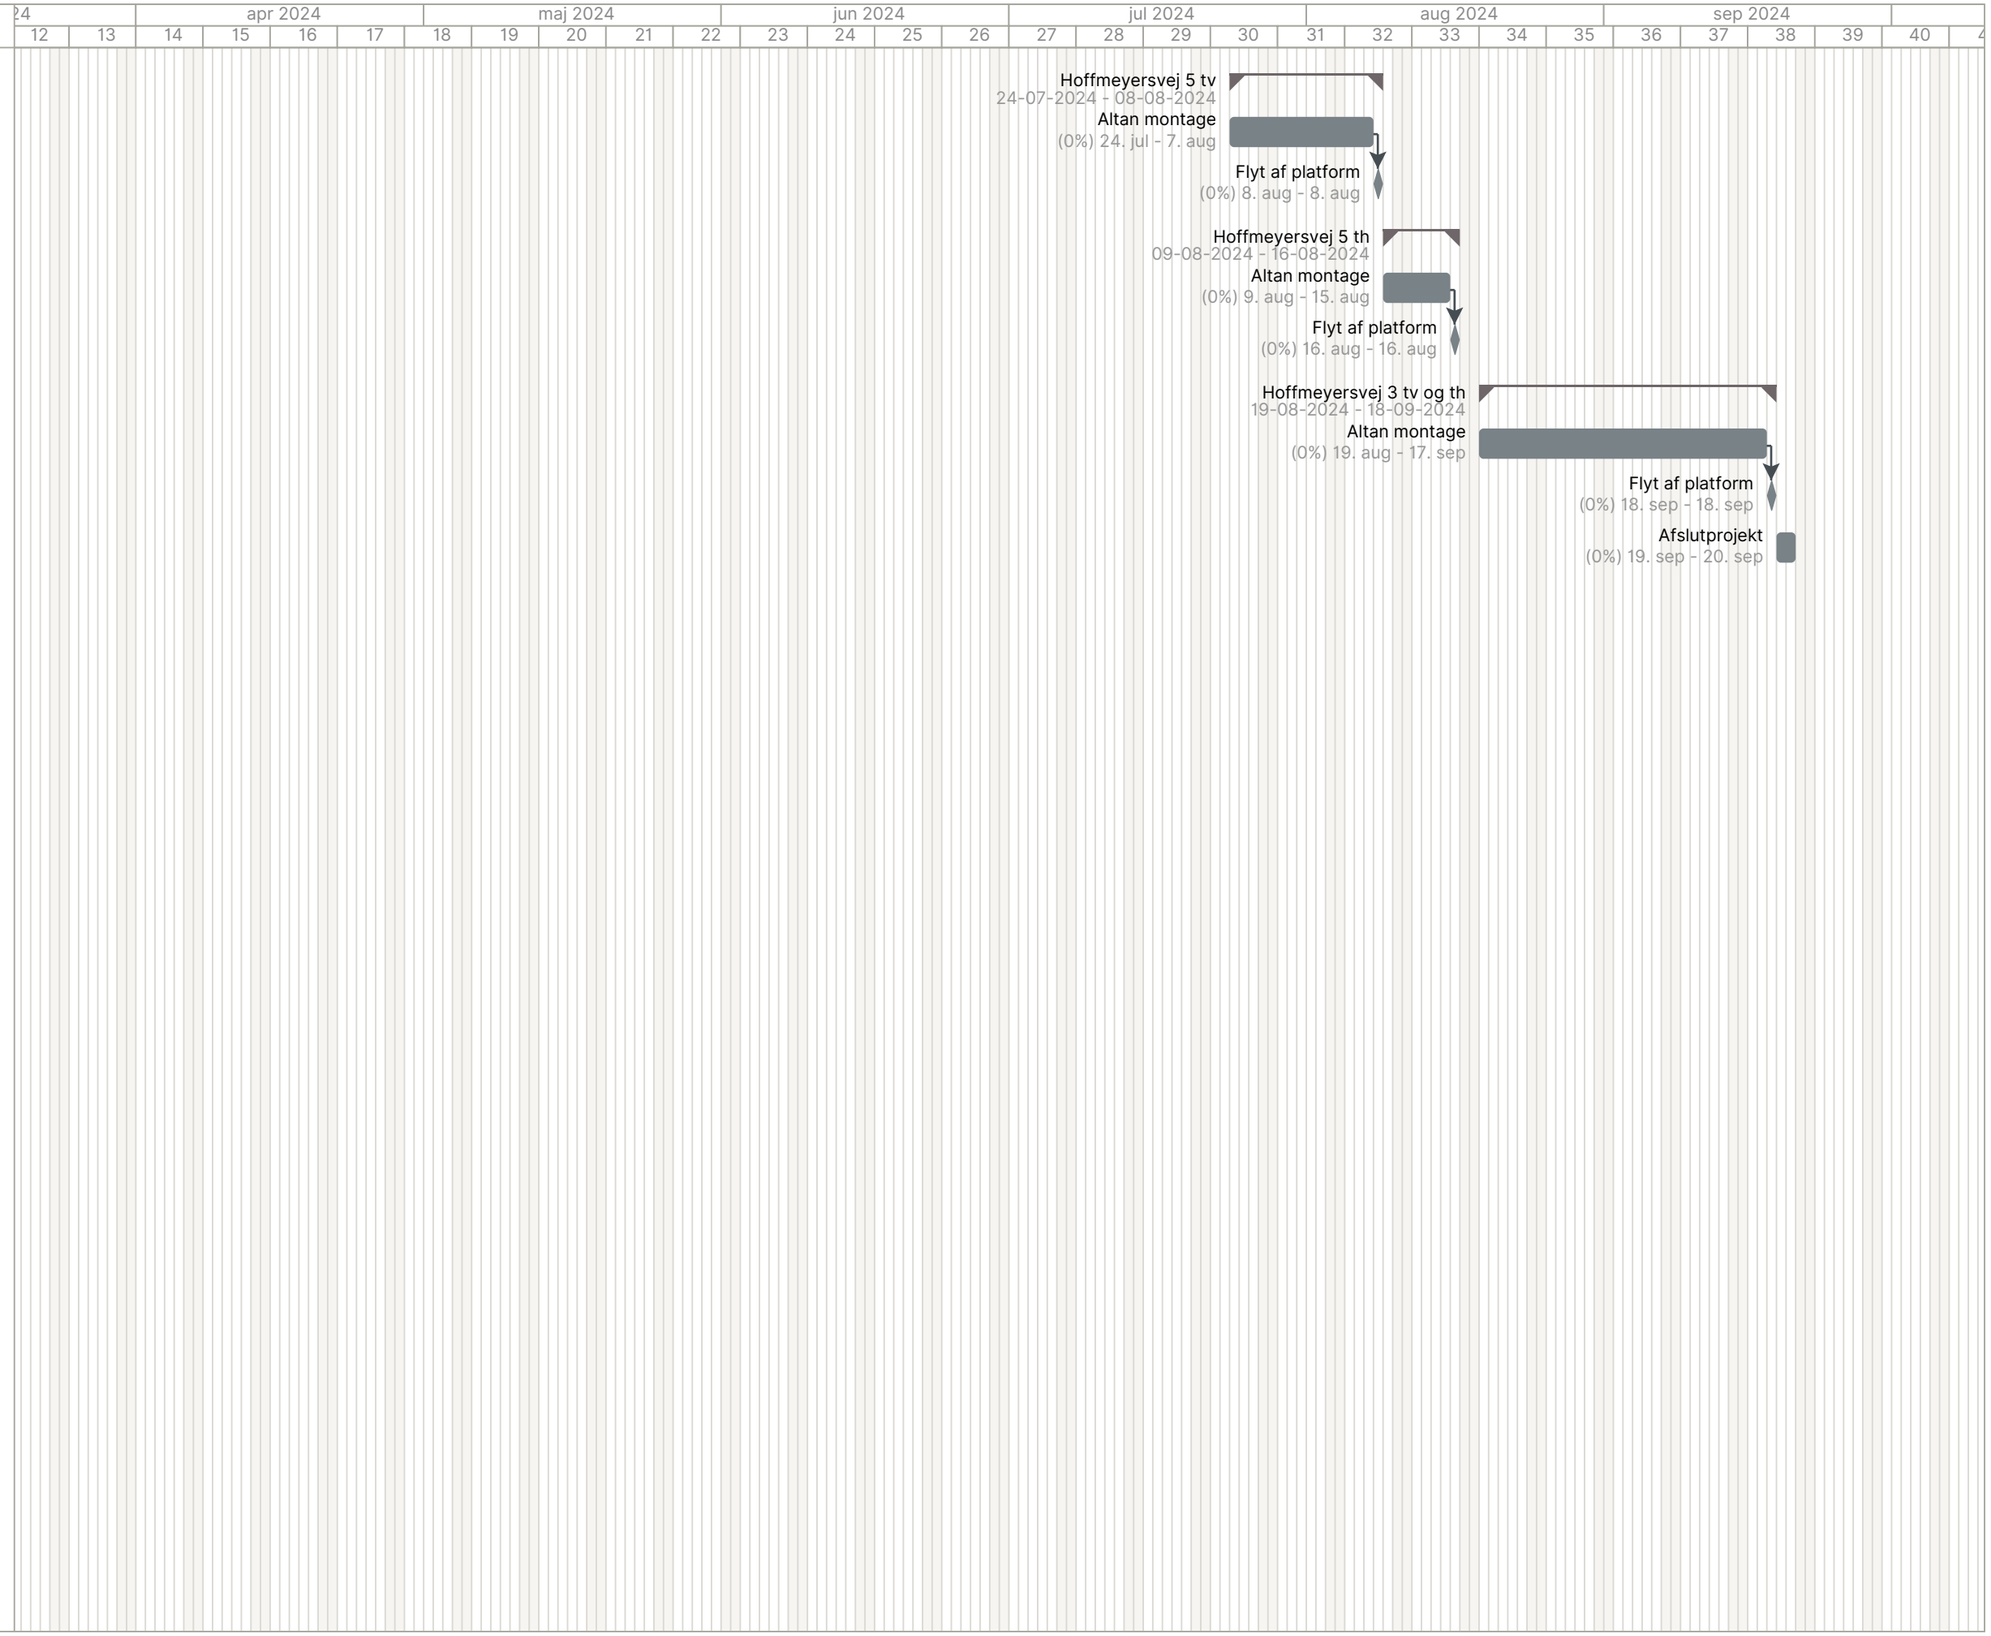
Navn	
Hoffmeyersvej 5 tv	24-07-2024 - 08-08-2024 (15 days)
Altan montage	24. jul - 7. aug (11 days) (0%)
Flyt af platform	8. aug - 8. aug (1 days) (0%)
Hoffmeyersvej 5 th	09-08-2024 - 16-08-2024 (7 days)
Altan montage	9. aug - 15. aug (5 days) (0%)
Flyt af platform	16. aug - 16. aug (1 days) (0%)
Hoffmeyersvej 3 tv og th	19-08-2024 - 18-09-2024 (30 days)
Altan montage	19. aug - 17. sep (22 days) (0%)
Flyt af platform	18. sep - 18. sep (1 days) (0%)
Afslutprojekt	19. sep - 20. sep (2 days) (0%)
