23078 AB Tove Estimeret tidsplan bygherre Rev. 2

Udskrevet den 17. juli 2024 15:07

POWERED BY LETSBUILD

Navn
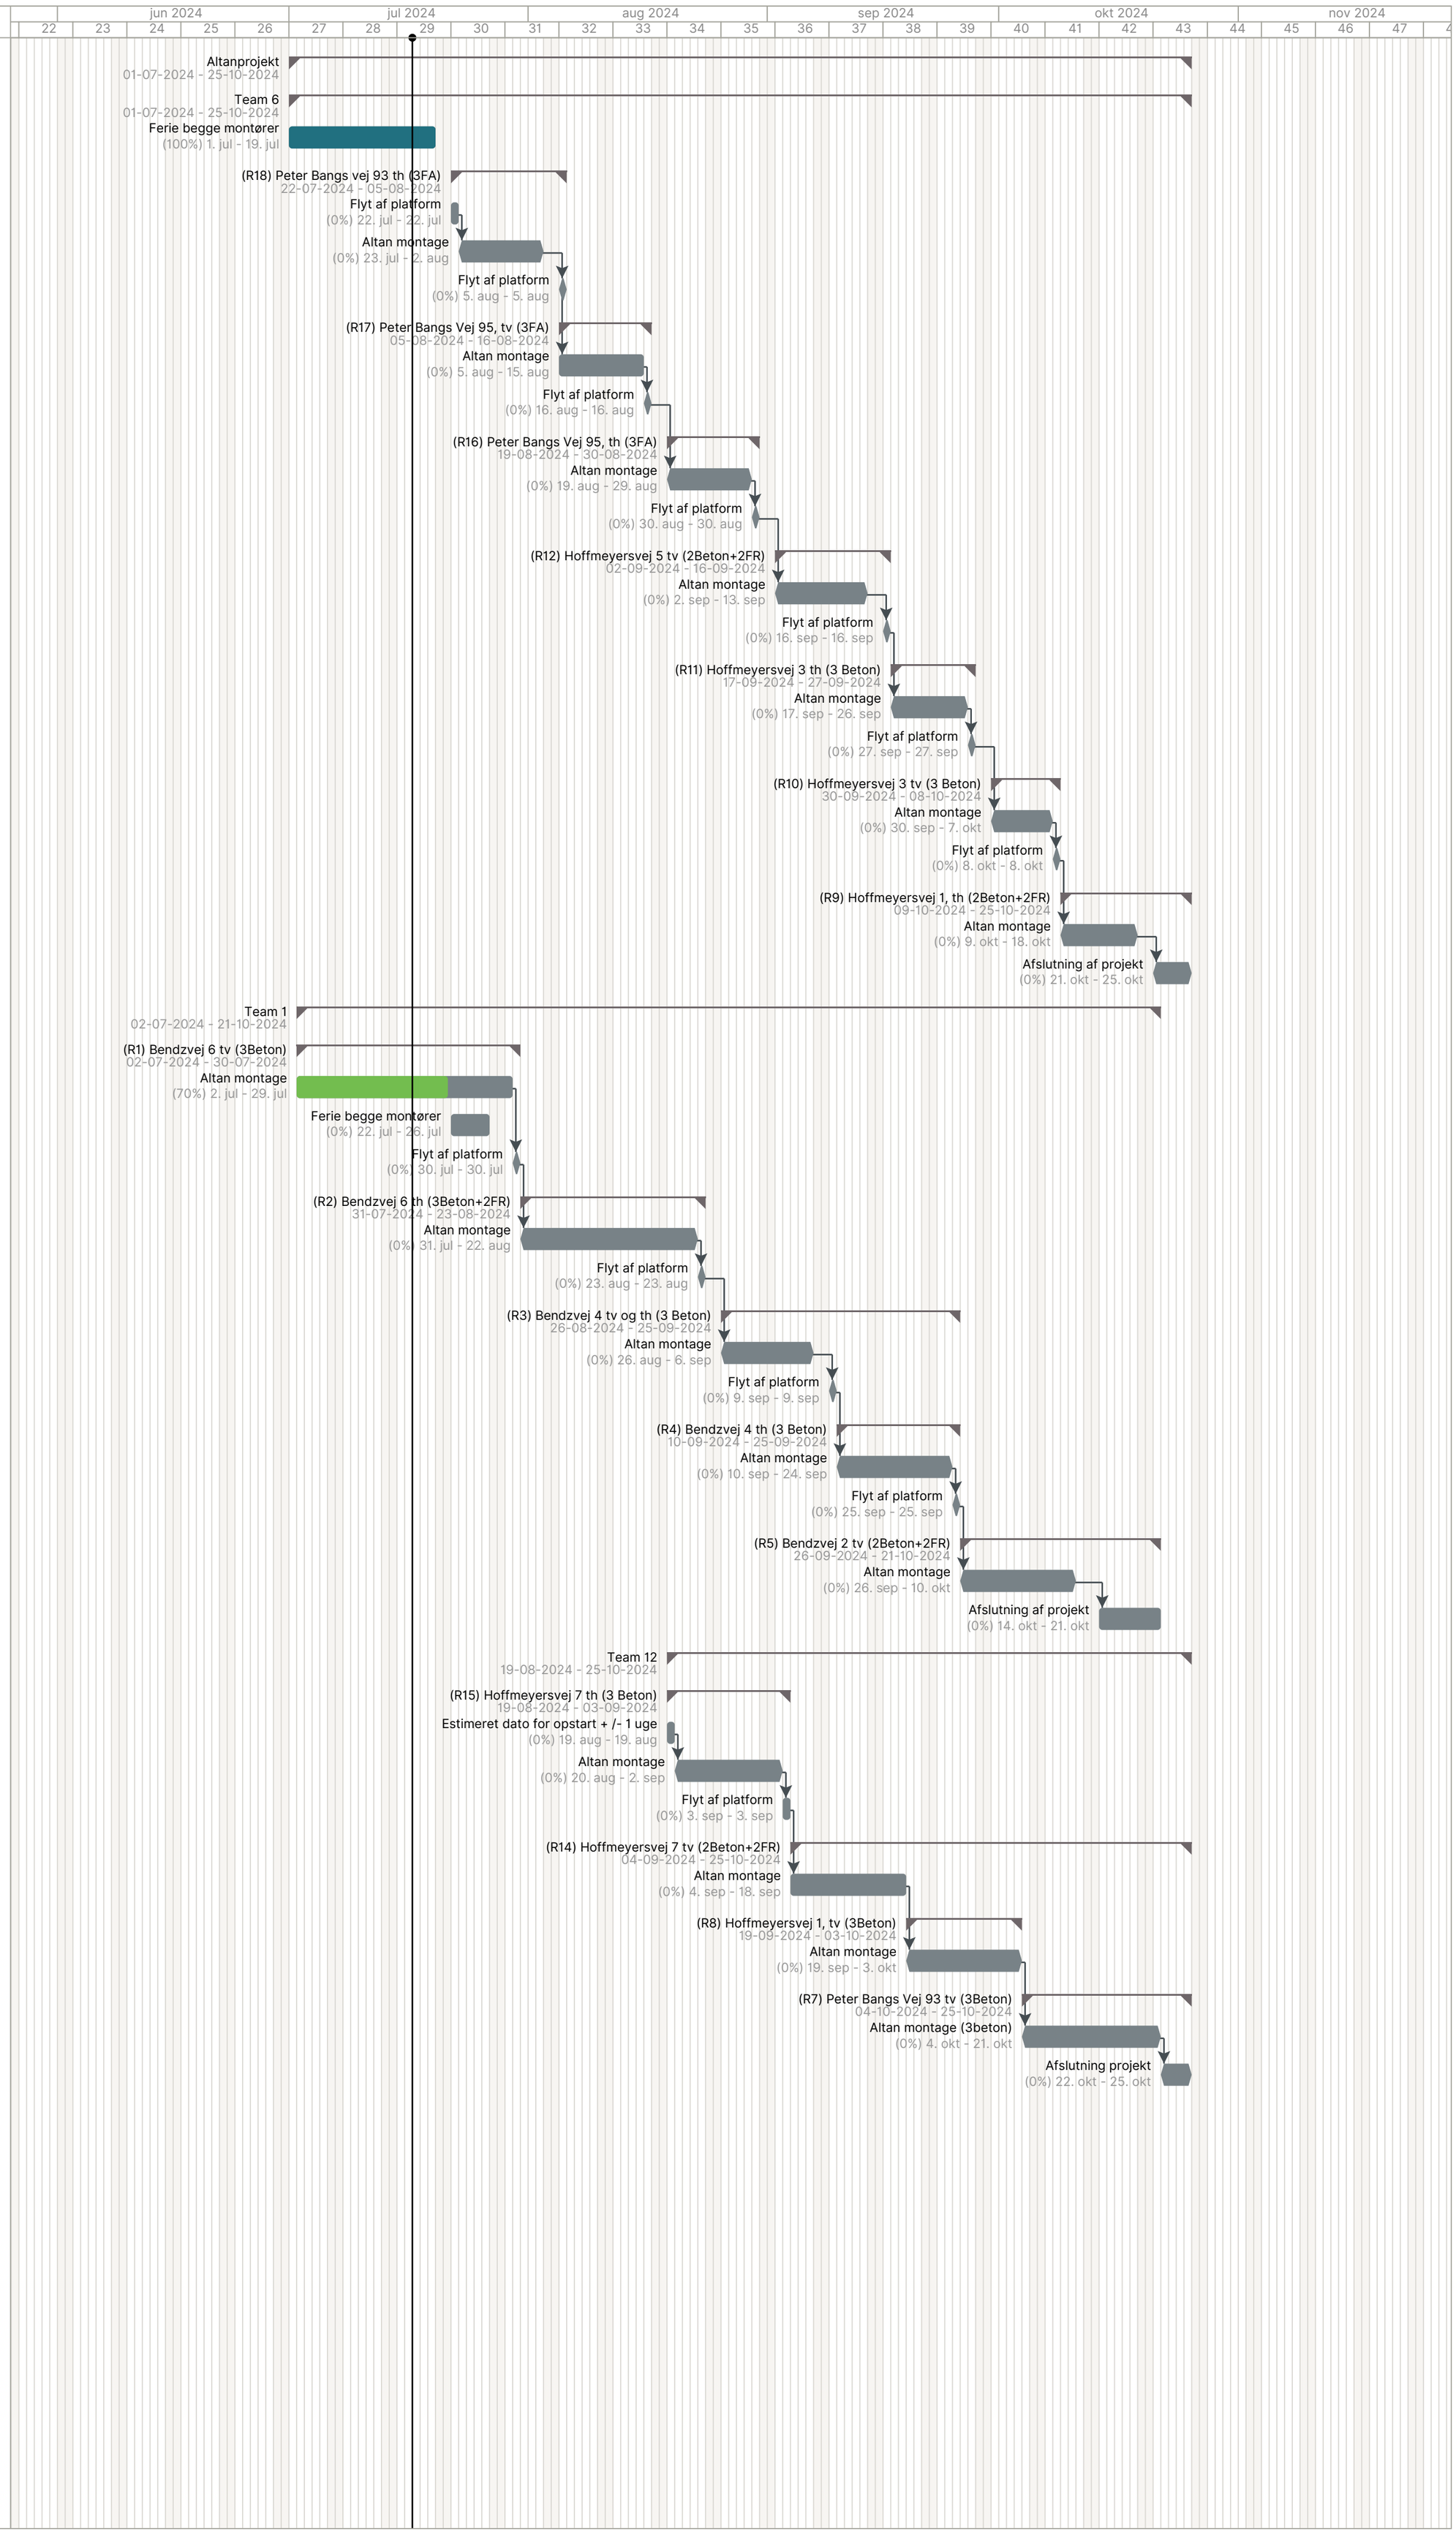
- Altanprojekt
  01-07-2024 - 25-10-2024 (116 days)
- Team 6
  01-07-2024 - 25-10-2024 (116 days)
  - Ferie begge montører
    1. jul - 19. jul (15 days) (100%)
  - (R18) Peter Bangs vej 93 th (3FA)
    22-07-2024 - 05-08-2024 (14 days)
    - Flyt af platform
      22. jul - 22. jul (1 days) (0%)
    - Altan montage
      23. jul - 2. aug (9 days) (0%)
    - Flyt af platform
      5. aug - 5. aug (1 days) (0%)
  - (R17) Peter Bangs Vej 95, tv (3FA)
    05-08-2024 - 16-08-2024 (11 days)
    - Altan montage
      5. aug - 15. aug (9 days) (0%)
    - Flyt af platform
      16. aug - 16. aug (1 days) (0%)
  - (R16) Peter Bangs Vej 95, th (3FA)
    19-08-2024 - 30-08-2024 (11 days)
    - Altan montage
      19. aug - 29. aug (9 days) (0%)
    - Flyt af platform
      30. aug - 30. aug (1 days) (0%)
  - (R12) Hoffmeyersvej 5 tv (2Beton+2FR)
    02-09-2024 - 16-09-2024 (14 days)
    - Altan montage
      2. sep - 13. sep (10 days) (0%)
    - Flyt af platform
      16. sep - 16. sep (1 days) (0%)
  - (R11) Hoffmeyersvej 3 th (3 Beton)
    17-09-2024 - 27-09-2024 (10 days)
    - Altan montage
      17. sep - 26. sep (8 days) (0%)
    - Flyt af platform
      27. sep - 27. sep (1 days) (0%)
  - (R10) Hoffmeyersvej 3 tv (3 Beton)
    30-09-2024 - 08-10-2024 (8 days)
    - Altan montage
      30. sep - 7. okt (6 days) (0%)
    - Flyt af platform
      8. okt - 8. okt (1 days) (0%)
  - (R9) Hoffmeyersvej 1, th (2Beton+2FR)
    09-10-2024 - 25-10-2024 (16 days)
    - Altan montage
      9. okt - 18. okt (8 days) (0%)
    - Afslutning af projekt
      21. okt - 25. okt (5 days) (0%)
- Team 1
  02-07-2024 - 21-10-2024 (111 days)
  - (R1) Bendzvej 6 tv (3Beton)
    02-07-2024 - 30-07-2024 (28 days)
    - Altan montage
      2. jul - 29. jul (20 days) (70%)
    - Ferie begge montører
      22. jul - 26. jul (5 days) (0%)
    - Flyt af platform
      30. jul - 30. jul (1 days) (0%)
  - (R2) Bendzvej 6 th (3Beton+2FR)
    31-07-2024 - 23-08-2024 (23 days)
    - Altan montage
      31. jul - 22. aug (17 days) (0%)
    - Flyt af platform
      23. aug - 23. aug (1 days) (0%)
  - (R3) Bendzvej 4 tv og th (3 Beton)
    26-08-2024 - 25-09-2024 (30 days)
    - Altan montage
      26. aug - 6. sep (10 days) (0%)
    - Flyt af platform
      9. sep - 9. sep (1 days) (0%)
  - (R4) Bendzvej 4 th (3 Beton)
    10-09-2024 - 25-09-2024 (15 days)
    - Altan montage
      10. sep - 24. sep (11 days) (0%)
    - Flyt af platform
      25. sep - 25. sep (1 days) (0%)
  - (R5) Bendzvej 2 tv (2Beton+2FR)
    26-09-2024 - 21-10-2024 (25 days)
    - Altan montage
      26. sep - 10. okt (11 days) (0%)
    - Afslutning af projekt
      14. okt - 21. okt (6 days) (0%)
- Team 12
  19-08-2024 - 25-10-2024 (67 days)
  - (R15) Hoffmeyersvej 7 th (3 Beton)
    19-08-2024 - 03-09-2024 (15 days)
    - Estimeret dato for opstart + /- 1 uge
      19. aug - 19. aug (1 days) (0%)
    - Altan montage
      20. aug - 2. sep (10 days) (0%)
    - Flyt af platform
      3. sep - 3. sep (1 days) (0%)
  - (R14) Hoffmeyersvej 7 tv (2Beton+2FR)
    04-09-2024 - 25-10-2024 (51 days)
    - Altan montage
      4. sep - 18. sep (11 days) (0%)
  - (R8) Hoffmeyersvej 1, tv (3Beton)
    19-09-2024 - 03-10-2024 (14 days)
    - Altan montage
      19. sep - 3. okt (11 days) (0%)
  - (R7) Peter Bangs Vej 93 tv (3Beton)
    04-10-2024 - 25-10-2024 (21 days)
    - Altan montage (3beton)
      4. okt - 21. okt (12 days) (0%)
    - Afslutning projekt
      22. okt - 25. okt (4 days) (0%)
