23078 AB Tove Estimeret tidsplan bygherre Rev. 4

Udskrevet den 19. august 2024 13:12

POWERED BY LETSBUILD

19-08-2024. REV 4
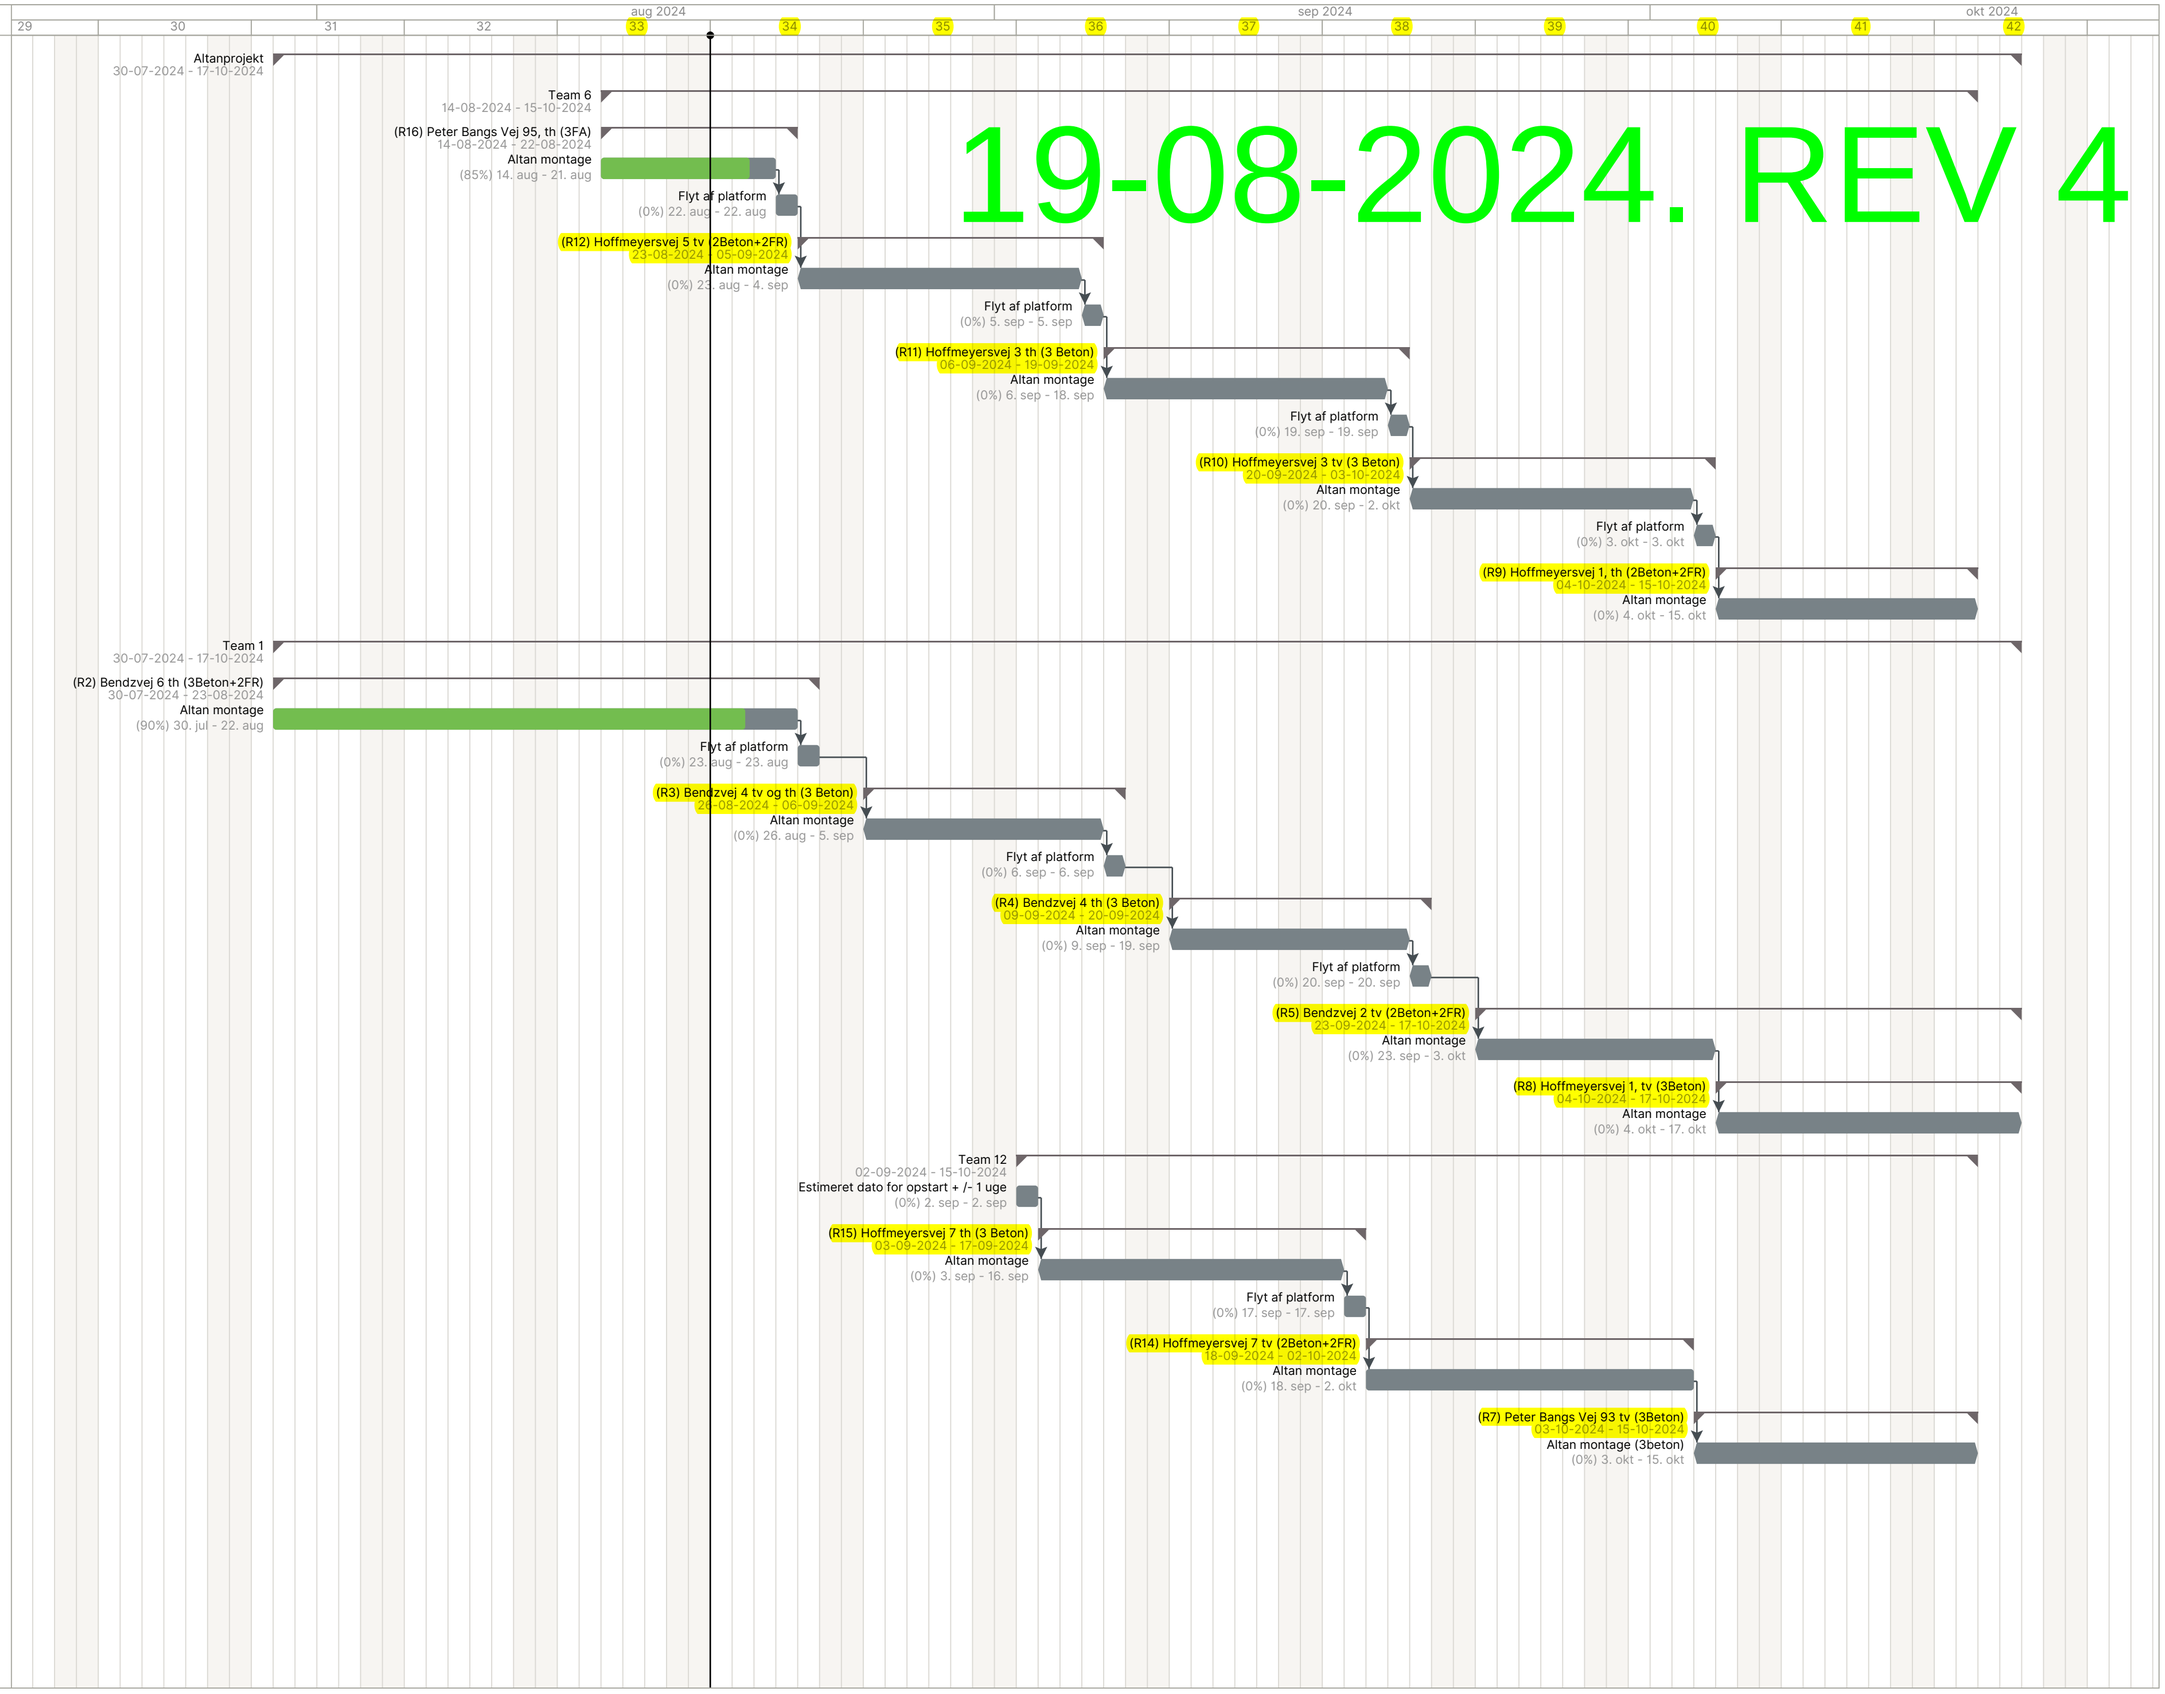
Navn	Start	Slut
Altanprojekt	30-07-2024	17-10-2024 (79 days)
Team 6	14-08-2024	15-10-2024 (62 days)
(R16) Peter Bangs Vej 95, th (3FA)	14-08-2024	22-08-2024 (8 days)
Altan montage	14. aug	21. aug (6 days) (85%)
Flyt af platform	22. aug	22. aug (1 days) (0%)
(R12) Hoffmeyersvej 5 tv (2Beton+2FR)	23-08-2024	05-09-2024 (13 days)
Altan montage	23. aug	4. sep (9 days) (0%)
Flyt af platform	5. sep	5. sep (1 days) (0%)
(R11) Hoffmeyersvej 3 th (3 Beton)	06-09-2024	19-09-2024 (13 days)
Altan montage	6. sep	18. sep (9 days) (0%)
Flyt af platform	19. sep	19. sep (1 days) (0%)
(R10) Hoffmeyersvej 3 tv (3 Beton)	20-09-2024	03-10-2024 (13 days)
Altan montage	20. sep	2. okt (9 days) (0%)
Flyt af platform	3. okt	3. okt (1 days) (0%)
(R9) Hoffmeyersvej 1, th (2Beton+2FR)	04-10-2024	15-10-2024 (11 days)
Altan montage	4. okt	15. okt (8 days) (0%)
Team 1	30-07-2024	17-10-2024 (79 days)
(R2) Bendzvej 6 th (3Beton+2FR)	30-07-2024	23-08-2024 (24 days)
Altan montage	30. jul	22. aug (18 days) (90%)
Flyt af platform	23. aug	23. aug (1 days) (0%)
(R3) Bendzvej 4 tv og th (3 Beton)	26-08-2024	06-09-2024 (11 days)
Altan montage	26. aug	5. sep (9 days) (0%)
Flyt af platform	6. sep	6. sep (1 days) (0%)
(R4) Bendzvej 4 th (3 Beton)	09-09-2024	20-09-2024 (11 days)
Altan montage	9. sep	19. sep (9 days) (0%)
Flyt af platform	20. sep	20. sep (1 days) (0%)
(R5) Bendzvej 2 tv (2Beton+2FR)	23-09-2024	17-10-2024 (24 days)
Altan montage	23. sep	3. okt (9 days) (0%)
(R8) Hoffmeyersvej 1, tv (3Beton)	04-10-2024	17-10-2024 (13 days)
Altan montage	4. okt	17. okt (10 days) (0%)
Team 12	02-09-2024	15-10-2024 (43 days)
Estimeret dato for opstart + /- 1 uge	2. sep	2. sep (1 days) (0%)
(R15) Hoffmeyersvej 7 th (3 Beton)	03-09-2024	17-09-2024 (14 days)
Altan montage	3. sep	16. sep (10 days) (0%)
Flyt af platform	17. sep	17. sep (1 days) (0%)
(R14) Hoffmeyersvej 7 tv (2Beton+2FR)	18-09-2024	02-10-2024 (14 days)
Altan montage	18. sep	2. okt (11 days) (0%)
(R7) Peter Bangs Vej 93 tv (3Beton)	03-10-2024	15-10-2024 (12 days)
Altan montage (3beton)	3. okt	15. okt (9 days) (0%)
